

RELATÓRIO MENSAL
ABRIL DE 2025

SOLAR SINATRA

ESCOL ENGENHARIA



Relatório mensal de acompanhamento da
evolução da Obra do Residencial Solar Sinatra.



02

ENSAIO DE ABSORÇÃO DO SOLO





03

TOPOGRAFIA: LOCAÇÃO DE EIXOS



ESCAVAÇÃO DO SUBSOLO






05

FORMA DE PILARES 22°/23° PAVTO TIPO



ESCORAMENTO E ASSOALHO DO 23º PAVTO TIPO

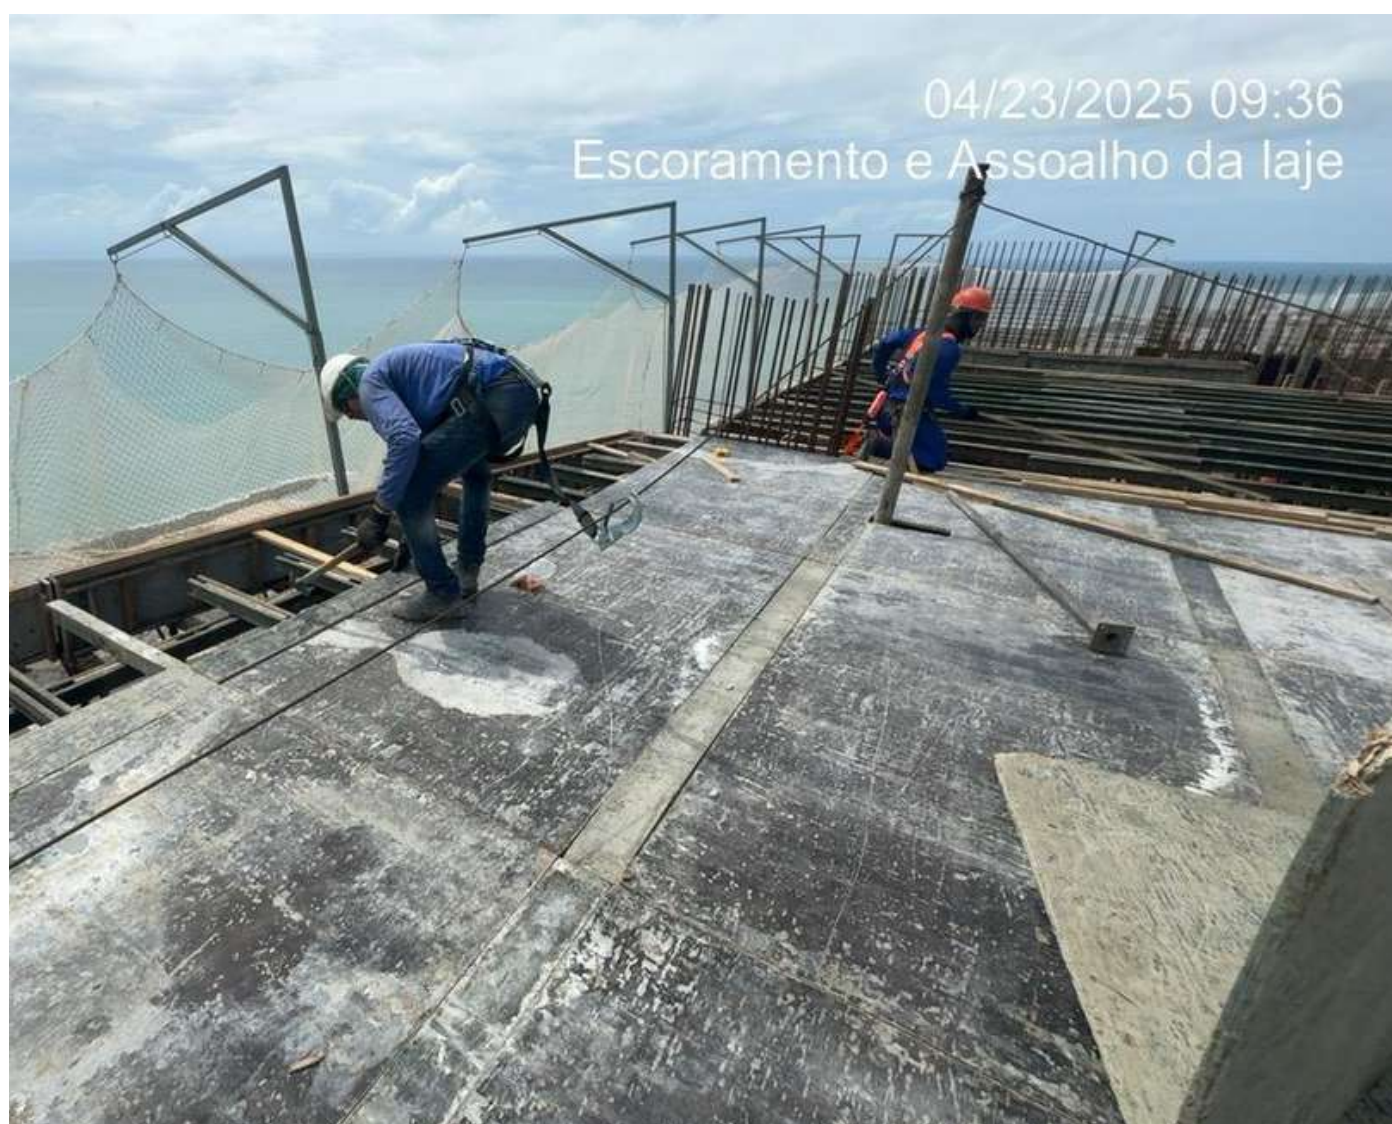



07

ARMAÇÃO DA LAJE DO 23º PAVTO TIPO



CONCRETAGEM DA LAJE 23º PAVTO TIPO





09

CHAPISCO DA ESTRUTURA 18° PAVTO TIPO





10

ELEVAÇÃO DA ALVENARIA 17º PAVTO TIPO





11

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 13º PAVTO TIPO





12


PRUMADA HIDROSSANITÁRIA 4° PAVTO TIPO





13

CHAPISCO DE ÁREA MOLHADA 4º PAVTO TIPO

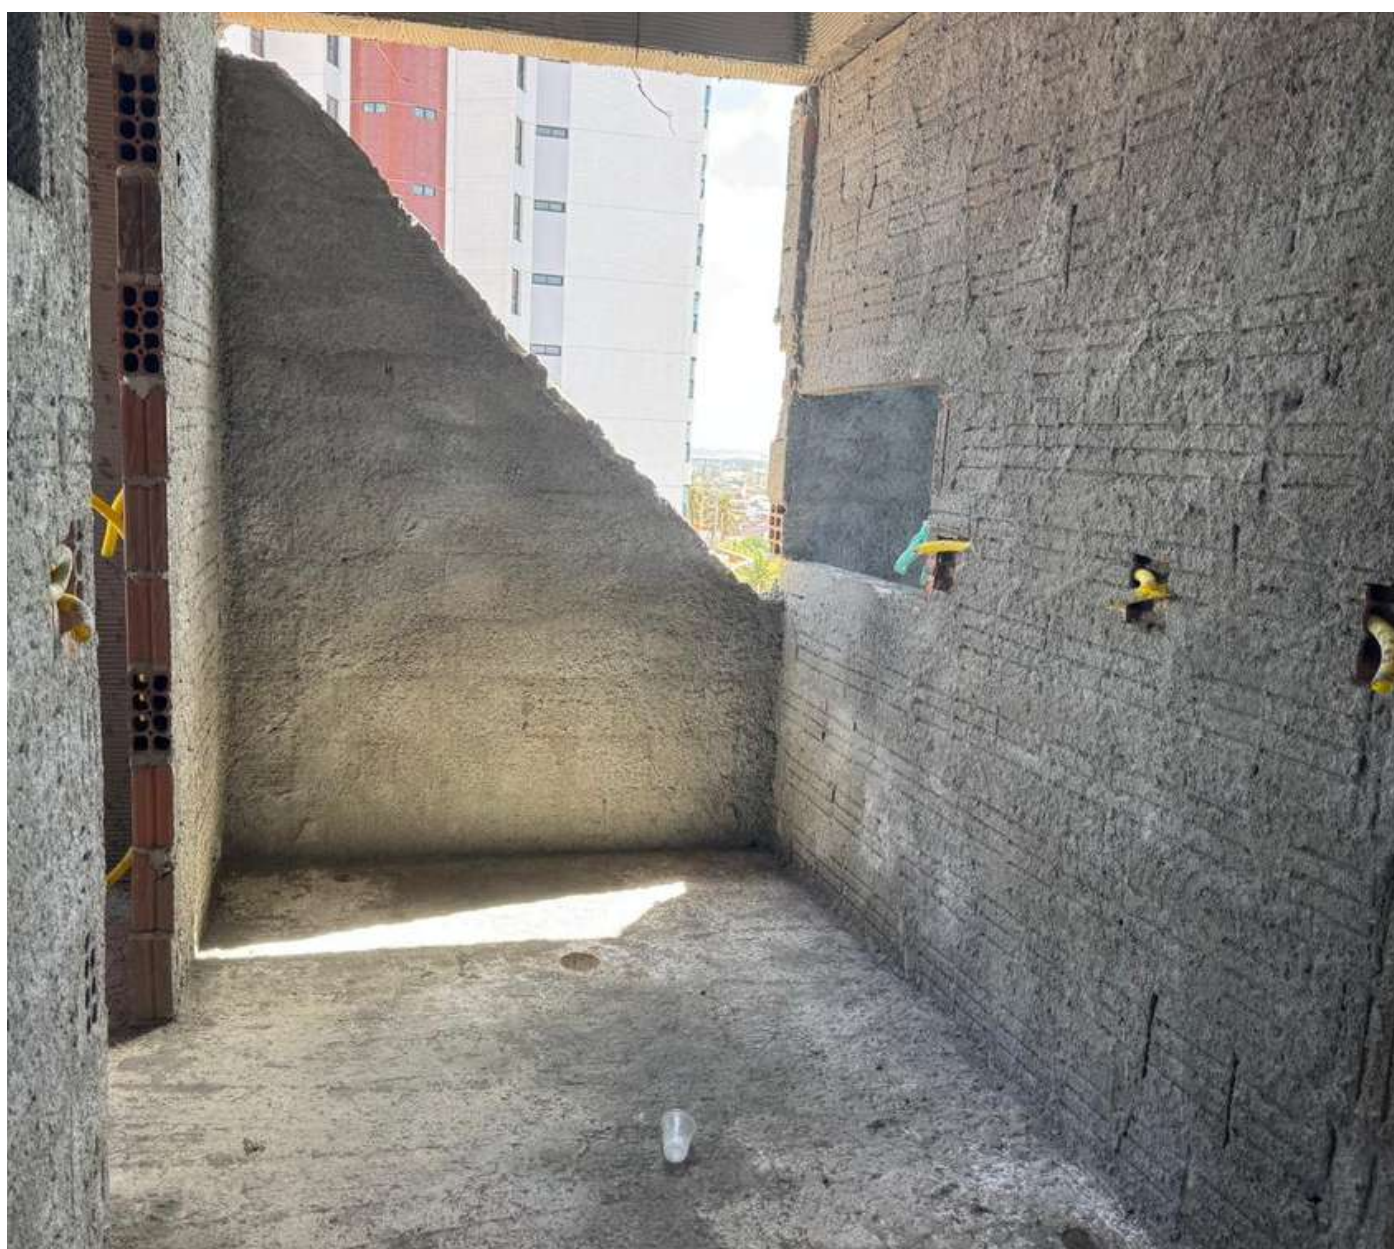



14

PANORAMA GERAL





INFORMAÇÕES RELEVANTES

Relatório de Avanço da Obra - Abril/25

Serviços Realizados

- Concretagem das lajes de piso dos pavimentos 21º, 22º e 23º tipo (24ª, 25ª e 26ª lajes);
- Continuação dos serviços de lixamento/chapisco até o 19º pavimento tipo;
- Marcação e elevação das alvenarias até o 18º pavimento tipo;
- Execução das instalações elétricas dos apartamentos;
- Ensaio de absorção do solo;
- Escavação na área do subsolo;
- Conferência topográfica dos eixos.

Plano para Maio/25

- Execução das lajes do 24º, 25º e 26º pavimento tipo;
- Início do ciclo do 27º pavimento;
- Continuação dos serviços de:
 - Lixamento/chapisco;
 - Marcação e elevação das alvenarias externas e internas;
 - Chapisco em alvenaria;
 - Escavação do subsolo; e
 - Prumadas de instalações hidrossanitárias.

Avanço da Obra

- Atingimos o percentual de **26,50%** referente à execução de obra.

